


IMPORTANT

La nuit du 16 au 17 novembre Convoi exceptionnel

Etat d'avancement - Bâtiment T8 - 9, novembre 2015

Début chantier
Juillet 2015

Fin chantier
Janvier 2016

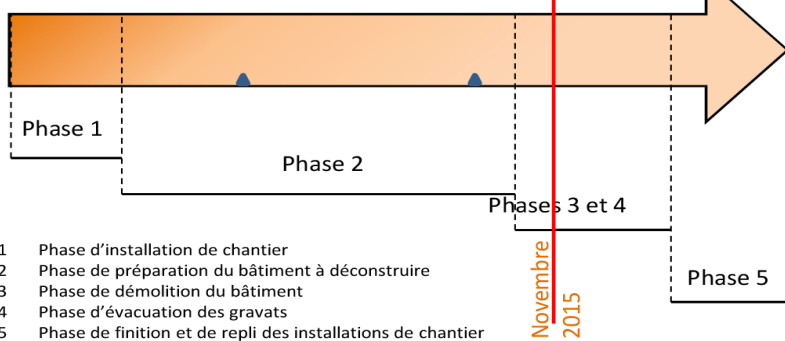

- Phase 1 Phase d'installation de chantier
- Phase 2 Phase de préparation du bâtiment à déconstruire
- Phase 3 Phase de démolition du bâtiment
- Phase 4 Phase d'évacuation des gravats
- Phase 5 Phase de finition et de repli des installations de chantier

■ Où en est on ?

Le chantier de déconstruction de l'immeuble T8 va entrer dans la « phase 3 » de démolition physique du bâtiment. Cette intervention se fera à l'aide d'une pelle mécanique équipée d'une pince pour « grignoter » progressivement la super structure du bâtiment et d'une pelle standard pour évacuer les gravats.

■ Convoi exceptionnel

Ces engins de chantier seront transportés par convoi exceptionnel. Ce type de transport respecte une réglementation routière stricte et a lieu **uniquement la nuit**.

Pour arriver jusqu'au chantier, le camion de transport passera **par l'avenue Paul Vaillant Couturier et la rue Alphonse de Lamartine**.

■ Stationnement gênant

Pour limiter la durée de livraison des engins et limiter les nuisances sonores générées, il est recommandé d'éviter de stationner dans les zones identifiées en rouge dans le schéma ci-contre et aux abords du chantier.

